


MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE

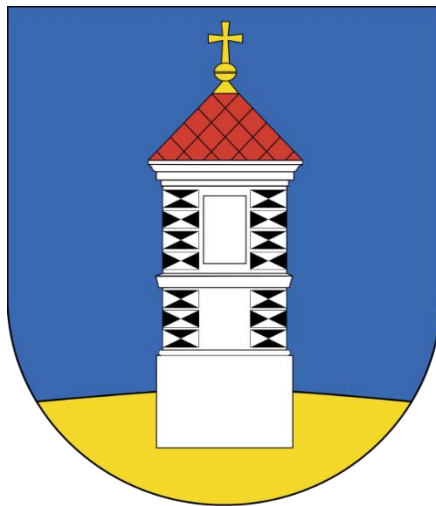

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva
mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

Bod rokovania	10.	
Názov materiálu	Monitorovacia správa plnenia akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024-2026	
Dátum rokovania	4. marec 2025	
Predkladateľ	JUDr. Ing. Miloš Ihnát starosta mestskej časti	Podpis
Spracovateľ	PhDr. Jaroslav Žďára vedúci oddelenia rozvoja a vnútornej správy	Podpis
Dôvod predloženia	Znenie §11 ods. 4 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení	

Návrh na uznesenie:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce

berie na vedomie

Monitorovaciu správu plnenia Akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024-2026

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na základe § 11 ods. 4 písm. c) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

schvaľuje

zmenu Akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024-2026 podľa predloženého návrhu

Dôvodová správa

V dôsledku zmeny okolností a vývoja celej problematiky dotýkajúcej sa prioritnej aktivity 8 „Bezpečnosť sídliska zlepšovaním a dopĺňaním kamerového systému“, ktorá je súčasťou Akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024-2026 navrhujeme jej zmenu v predloženom znení. Nové znenie zjednodušuje opis samotnej aktivity, aktualizuje ju a zjednocuje ju s opisom ostatných aktivít.

Zároveň predkladáme správu, ktorá monitoruje plnenie jednotlivých aktivít k 31.12.2024.

Spracoval:

PhDr. Jaroslav Žďára, vedúci oddelenia rozvoja a vnútornej správy

**Monitorovacia správa Akčného plánu mestskej časti
Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 – 2026 za rok 2024**

Metodika spracovania materiálu:

Monitorovacia správa Akčného plánu mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce na roky 2024 – 2026 (ďalej len Akčný plán) za rok 2024 priamo vychádza z aktivít stanovených v tomto Akčnom pláne, pričom vyhodnocuje faktický stav naplňania týchto aktivít k 31.12.2024. Monitorovacia správa pozostáva z dvoch častí, a to: „Prioritné aktivity“ a „Ďalšie aktivity“.

Vyhodnotenie každej z 11 prioritných aktivít obsahuje nasledovné časti:

Opis je textovým vyhodnotením aktivít. Uvádza, ktoré činnosti sa realizovali, aké problémy počas realizácie nastali a aká je vízia naplňania aktivity do budúcnosti.

Prehľad je skrátenou verziou a časovou osou opisu. Uvádza základné informácie toho čo sa podarilo v roku 2024 a aké sú predpoklady na rok 2025 a 2026.

Vyhodnotenie je tabuľkovou časťou vyhodnotenia. Tabuľka vyhodnocuje základné definované kvantitatívne veličiny ako financie a ukazovatele, pri ktorých porovnáva ich skutočnú hodnotu s plánovanou hodnotou definovanou v Akčnom pláne.

Druhá časť monitorovacej správy sa venuje ďalším aktivitám, ktoré sú v Akčnom pláne definované ako „Zásobník ďalších aktivít“ a „Ďalšie aktivity v úrovni vízií pre budúce obdobia“. Uvedené aktivity sú spracované v tabuľkovej forme, kde je uvedený názov aktivity, stav rozpracovanosti resp. realizácie: ktorá je vyhodnotená v škále áno / nie / čiastočne a následne stručným opisom stavu jednotlivých aktivít.

Spracoval: PhDr Jaroslav Žďára
Bc. Jaroslav Gyesko

Prioritné aktivity:

1. Vysporiadanie pozemkov

Opis:

V rámci aktivity „Vysporiadanie pozemkov“ boli v roku 2024 realizované kroky vedúce k úspešnému vysporiadaniu viacerých lokalít v mestskej časti. Konkrétne sa realizovali výkupy pozemkov pod Florparkom, budúcim Europarkom, ako aj pod budovou miestneho úradu. Rovnako boli vysporiadavané pozemky pod parkoviskami na uliciach Berlínska a Aténska, a taktiež pod zdravotným strediskom, ktorý je však vo vlastníctve mesta. Okrem realizácie výkupov si mestská časť od mesta prenajíkala aj ďalšie pozemky na rozvojové aktivity za nájmy hodné osobitného zreteľa. Pre roky 2025 a 2026 sa plánuje pokračovať vo vysporiadavaní pozemkov.

Prehľad:

- **2025** – vysporiadavané pozemky pod: Europark, Florpark, Miestny úrad, parkoviská Berlínska a Aténska, zdravotné stredisko,
- **2025 a 2026** – predpokladá sa splnenie ukazovateľov a pokračovanie v realizácii aktivity.

Vyhodnotenie¹:

Za rok 2024	Plánované	Skutočnosť
Financie	35 000 €	51 851,55 €
Ukazovatele (počet vysporiadaných m2)	400 m2	941,855 m2

¹ Vyhodnotenie sa týka len výkupov pozemkov od súkromných vlastníkov. Tabuľka sa nevenuje prenájomom pozemkov od mesta Košice.

2. Vybudovanie Europarku

Opis:

V rámci aktivity „Vybudovanie Europarku“ boli dosiahnuté kroky najmä v prípravnej fáze projektu. V roku 2024 bolo získané územné rozhodnutie, koncom roka 2024 bol obstaraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie ďalších stupňov. Predpokladá sa, že projektovú dokumentáciu dodá zhotoviteľ v polovici roka 2025. Predpoklad pre získanie právoplatného stavebného povolenia je 1. štvrt'rok 2026. Súbežne s dokončovaním PD a následným stavebným konaním je v pláne riešenie výrubového konania a kroky vedúce k získaniu externých finančných zdrojov. Pre úspešné zrealizovanie celého zámeru je však potrebné vytvoriť si dostatočnú finančnú rezervu aj na pokrytie spoluúčasti pri externom financovaní (min. 20 % z odhadovaných nákladov). Dá sa tak konštatovať, že projekt sleduje svoj stanovený zámer a plánovanú časovú os.

Prehľad:

- **2024** – získané územné rozhodnutie, obstaraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie pre ďalšie stupne, vykupovanie pozemkov,
- **07/2025** - dokončenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu,
- **1. štvrt'rok /2026** – získanie stavebného povolenia
- **2026/2027** – obstarávanie zhotoviteľa, projektový manažment externého financovania, samotná realizácia.

Vyhodnotenie:

Za rok 2024	Plánované	Skutočnosť
Financie	15 000 €	8 613,13 € (pozemky, vyjadrovanie k dokumentácii, znalecký posudok)
Ukazovatele (realizácia projektu ako celku)	0	0

3. Reštaurovanie pamätníka „Božie muky“

Opis:

V rámci aktivity „Božie muky“ boli v roku 2024 vykonané viaceré činnosti. Okolie pamätníka bolo predmetom archeologického prieskumu, v priebehu ktorého boli nájdené kostrové pozostatky padlých poľských vojakov z 19. storočia. Tento objav výrazne ovplyvnil priebeh aktivity, ako aj význam dotknutej lokality. Uvedené malo vplyv aj na plánovanú revitalizáciu, čo bolo reflektované spracovaním urbanistickej štúdie. Aktuálne je pozornosť pri tejto aktivite sústredená na pokračovanie archeologického prieskumu so zameraním na identifikáciu nájdených pozostatkov a pokračovanie v spracovaní kompletnej projektovej dokumentácie za účelom celkovej revitalizácie pamätníka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa pre rok 2025 nepredpokladá vybudovanie oplotenia okolo pamätníka tak ako je plánované, ale táto aktivita vrátane dokončenia revitalizácie sa predpokladá na rok 2026.

Prehľad:

- **2024**
 - vypracovaná architektonická štúdia za účelom revitalizácie pamätníka – 7080€,
 - ukončenie 1 fázy archeologického prieskumu – nájdené pozostatky padlých poľských vojakov z 19. storočia (vplyv na zmenu aktivity/významu lokality).
- **2025**
 - pokračovanie v archeologickom prieskume – identifikácia pôvodu padlých vojakov,
 - spracovanie projektovej dokumentácie pre komplexnú revitalizáciu,
 - realizácia oplotenia presunutá na rok 2026.
- **2026** - plánovaná realizácia revitalizácie.

Vyhodnotenie:

Za rok 2024	Plánované	Skutočnosť
Financie	2 500 €	9 580 € <i>(archeologický prieskum, urbanistické štúdia)</i>
Ukazovatele <i>(počet realizovaných častí)</i>	1	1

4. Revitalizácia nevyužívaných asfaltových plôch

Opis:

V rámci aktivity „Revitalizácia nevyužívaných asfaltových plôch“ sa v roku 2024 nerealizovala žiadna činnosť, čo sa však predpokladalo a ukazovateľ bol preto splnený. V roku 2025 je v rozpočte zahrnutá rekonštrukcia basketbalového ihriska Sofijská-Varšavská vo výške 10 000 €, rovnako aj spracovanie projektovej dokumentácie pre asfaltovú plochu Juhoslovanská vo výške 10 000 €.

Prehľad:

- **2024** – nebol realizovaný ani plánovaný žiaden zámer (podľa plánu).
- **2025**
 - rekonštrukcia basketbalového ihriska Sofijská – Varšavská (10 000 €),
 - spracovanie projektovej dokumentácie basketbalového ihriska Juhoslovanská (10 000 €).
- **2026** – pokračovanie v realizácii aktivity.

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	0 €	0 €
Ukazovatele <i>(počet revitalizovaných plôch)</i>	0	0

5. Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva – prestavba kontajnerovísk

Opis:

V rámci aktivity „Zlepšenie kvality odpadového hospodárstva – prestavba kontajnerovísk“ sa v roku 2024 nepodarilo naplniť stanovený počet 5 polopodzemných kontajnerovísk. Dôvodom bolo prenechanie jedného z prisľúbených stojísk mestskej časti Košice-Ľahanovce, kde bude stojisko zrealizované na ulici Madridská (v tesnej blízkosti MČ KE-Sídl. Ľahanovce) a realizácia iba 2 stojísk na Belehradskej a Čínskej ulici. K zvyšným 2 stojiskám (Budapeštianska a Pekinská) boli začaté povoľovacie procesy. V roku 2025 sa predpokladá realizovanie uvedených stojísk (*pozn.: na Budapeštianskej už práce prebiehajú*), realizácia ďalších stojísk nie je zatiaľ ohlásená. Rovnako to platí i pre rok 2026.

Prehľad:

- **2024** – realizované 2 polopodzemné kontajneroviská (Belehradská a Čínska ulica),
- **2025** – predpokladaná realizácia 2 polopodzemných kontajnerovísk (Budapeštianska, Pekinská).

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	-	0
Ukazovatele <i>(počet vybudovaných stojísk)</i>	5	2

6. Cestné výjazdy zo Sídlička Ťahanovce z Americkej triedy

Opis:

V rámci aktivity „Cestné výjazdy zo Sídlička Ťahanovce z Americkej triedy“ sa v roku 2024 nepodarilo vysúťažiť zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie pre výjazd Americká trieda – Medirex. Tento zámer bol posunutý na rok 2025. Posun pri realizácii zvyšných výjazdov je závislý od schválenia územného plánu, ktoré sa predpokladá na rok 2025. Vzhľadom na priemernú dĺžku povoľovacích procesov a problematický majetkovo-právny vzťah pozemkov sa ich realizácia do roku 2026 nepredpokladá.

Prehľad:

- **2024** – realizovaná súťaž na zhotovenie PD výjazd Americká trieda - Medirex, nepodarilo sa vysúťažiť zhotoviteľa, presunuté na rok 2025,
- **2025** – realizácia PD pre územné konanie výjazd Americká trieda – Medirex, schválenie nového územného plánu,
- **2026** – nepredpokladá sa výraznejší posun.

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	10 000 €	0 €
Ukazovatele <i>(počet vybudovaných výjazdov)</i>	0	0

7. Parkovacie domy

Opis:

V rámci aktivity „Parkovacie domy“ prebiehali v roku 2024 intenzívne rokovania medzi predstaviteľmi MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, mesta Košice a súkromným investorom v otázke výstavby parkovacieho domu na ulici Pekinská/Hanojská. Na základe novej vízie mesta sa má na uvedenom mieste postaviť bytový objekt určený na nájomné bývanie spojené s parkovaním. Realizácia uvedenej vízie je však komplikovanejšia ako samotný parkovací dom, čo oddŕaľuje jeho realizáciu. O iných parkovacích domoch sa v súčasnosti neuvažuje.

Prehľad:

- **2024** – realizované rokovania medzi zapojenými stranami, vízia nájomných bytov,
- **2025/2026** – nepredpokladá sa výstavba, resp. výrazný posun v aktivite.

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	-	0 €
Ukazovatele <i>(počet vybudovaných parkovacích domov)</i>	0	0

8. Bezpečnosť sídliska zlepšováním a dopĺňáním kamerového systému

Opis:

V rámci aktivity „Bezpečnosť sídliska zlepšováním a dopĺňáním kamerového systému“ sa v roku 2024 neuskutočnila akákoľvek inštalácia kamier vzhľadom na možnosti čerpania externých zdrojov. Pôvodný zámer inštalácie miestneho kamerového pultu v hodnote 7000€ na oddelení MsP nebol realizovaný z dôvodu zmien a neistoty vo veci fungovania pracoviska na území MČ. Na základe posledného vývoja situácie bol tento zámer presunutý na rok 2025. V roku 2025 MČ plánuje zakúpiť a inštalovať 2 kamery vo Florparku, pričom ďalších približne 10 kamier by malo byť osadených mestom v rámci rozsiahleho mestského projektu. Z tohto dôvodu sa upustilo od opätovného obstarania projektovej dokumentácie, pričom bolo rozhodnuté, že je racionálnejšie poskytnúť mestu súčinnosť v príprave spomenutého projektu. Realizácia projektu sa vzhľadom na jeho rozpracovanosť a povoloňovacie procesy odhaduje na rok 2025 až 2026.

Prehľad:

- **2024** – nerealizovaná inštalácia kamier – problematika externých zdrojov, nerealizovaná inštalácia miestneho kamerového pultu na MsP – presunutá na rok 2025,
- **2025** – osadenie 2 kamier vo Florparku zo strany MČ (10 000 €), inštalácia pultu ochrany na oddelení MsP (7 000 €),
- **2025 / 2026** – inštalácia 10 kamier zo strany mesta.

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	7 000 €	0 €
Ukazovatele <i>(počet osadených nových kamier)</i>	0	0

9. Debarierizácia mestskej časti pre chodcov

Opis:

V rámci aktivity „Debarierizácia mestskej časti pre chodcov“ boli v roku 2024 v súvislosti čiastkovými aj súvislými opravami chodníkov realizované opravy existujúcich bezbariérových vstupov, ako aj vytvorenie nových bezbariérových vstupov na existujúce chodníky. Mestská časť opravila bezbariérový prístup na Bruselskej 5 a vytvorila nový bezbariérový priechod pre chodcov medzi Aténskou 10 a ZŠ Bruselská a bezbariérové prístupy od oddychovej zóny Čínska a Varšavská 17. Mesto Košice na základe požiadaviek mestskej časti opravilo bezbariérový priechod medzi Budapeštianskou 16 – 18 (*pozn. pri tomto úseku sa v roku 2025 uvažuje o prehodnotení zrealizovaného riešenia a jeho kompletnej zmene t.j. vytvorenie súvislého chodníka*) a Budapeštianskou 18 - 20. Zároveň zrealizovalo nové bezbariérové úpravy na Budapeštianskej 40 – 42, Budapeštianskej 6 – 8 a Bukureštskej 22. Pre roky 2025 sa predpokladá v pokračovaní zámeru. Plánované sú bezbariérové úpravy na priechodoch Čínska – Ázijská trieda, Aténska 19, Belehradská pri zastávke MHD, Budapeštianska – Maďarská, Bruselská. Zároveň sa plánuje aj výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici.

Prehľad:

- **2024** – MČ: oprava: Bruselská 5, nová bezbariérová úprava: Aténska 10 – ZŠ Bruselská, Varšavská 17, oddychová zóna Čínska Mesto Košice: oprava: Budapeštianska 16 – 18, Budapeštianska 18 – 20, nové bezbariérové úpravy: Budapeštianska 40 – 42, Budapeštianska 6 – 8, Bukureštská 22,
- **2025** – plánované: Varšavská 18 z dvora, Čínska – Ázijská trieda, Aténska 19, Belehradská pri zastávke MHD, Budapeštianska – Maďarská, Bruselská, výstavba bezbariérových prístupov k detským ihriskám na Aténskej a Viedenskej ulici,
- **2026** – pokračovanie zámeru.
-

Vyhodnotenie:

Za rok 2024	Plánované	Skutočnosť
Financie	17 500 €	22 565,21 € (iba náklady MČ)
Ukazovatele (počet zrealizovaných bezbariérových úprav)	5	7,5²

² Pri stanovení hodnoty uvedeného ukazovateľa sme vychádzali z nasledovnej metodiky. Oprave existujúceho bezbariérového vstupu sme prideliť hodnotu 0,5 a vytvorenia novej bezbariérovej úpravy malo hodnotu 1. Následne sa hodnoty sčítali. Do celkového súčtu sa rátali ako úpravy a opravy realizované mestskou časťou, tak aj mestom Košice. Vytvorenie bezbariérového vstupu do oddychovej zóny Čínska je uvedené aj ako samostatná aktivita v časti „Zásobník ďalších aktivít“.

10. Bezpečnosť MČ dopĺňaním bodov verejného osvetlenia

Opis:

V rámci aktivity „Bezpečnosť MČ dopĺňaním bodov verejného osvetlenia“ sa v roku 2024 realizovalo osadenie nových bodov verejného osvetlenia na viacerých miestach. Na úseku Aténska – Americká trieda boli osadené 4 stožiare, a Juhoslovanská – Varšavská 5 stožiarov. Na priechode pre chodcov na križovatke ulíc Belehradská č. 1 a Ázijská trieda boli osadené 2 stožiare verejného osvetlenia vrátane značiek s inteligentnou svetelnou signalizáciou, rovnako tak aj na križovatke ulíc Berlínska 29 – Aténska 1 - Európska trieda. Pre rok 2025 sa plánuje realizácia 5 nových stožiarov na Berlínskej č. 14 – 21. Pravdepodobne pribudnú i ďalšie osvetlenia na priechody pre chodcov cez hlavné triedy MČ. V štádiu projektovania a povoľovania je doplnenie osvetlenia v lokalite K-Park – Žihadielko a verejné osvetlenie pri priechode v lokalite Ázijská trieda – Havanská – Maďarska. Ďalšími požiadavkami mestskej časti do budúcich období sú lokality: Materská škola Havanská 26, Juhoslovanská 1 - Budapeštianska 18, Čínska 2-22, Bruselská – Európska trieda (pod Florparkom), okolie ZŠ Bruselská a modernizácia osvetlenia v POV Budapeštianska (pasáž).

Prehľad:

- **2024** – osadené osvetlenie na Aténskej (4x), Juhoslovanskej a Varšavskej (5x), 2x osadený stožiar na PpP Belehradská 1 – Ázijská trieda 1, 2x osadený stožiar na križovatke PpP Berlínska 29 – Aténska 1 – Európska trieda,
- **2025** – plánovaná inštalácia 5 stožiarov na ulici Berlínska č. 14 – 21,
- **2026** – pokračovanie v zámeroch podľa požiadaviek mestskej časti a finančných možností mesta Košice.

Vyhodnotenie:

Za rok 2024	Plánované	Skutočnosť
Financie	-	0 €
Ukazovatele (počet novovybudovaných svetelných bodov)	3	15

11. Rozvoj Florparku

Opis:

V rámci aktivity „Rozvoj Florparku“ sa v roku 2024 riešilo majetkové vysporiadanie danej lokality. Mobilné nafukovacie prestrešenie sa v súčasnosti nerealizuje, je možné, že príčinou je odchod iniciátora myšlienky, riaditeľa ZŠ Bruselská do dôchodku a náročnosť získania potrebných parciel na realizáciu. V roku 2025 sa plánuje zakúpenie nových mantinelov, osadenie bezpečnostných kamier, zriadenie smart zamykania areálu. V pláne je tiež pokračovanie vo výkupe pozemkov.

Prehľad:

- **2024** – vysporiadanie niektorých pozemkov, stagnácia projektu prestrešenia,
- **2025** – pokračovanie vo výkupe pozemkov, zakúpenie kamier, mantinelov, smart zamykania.

Vyhodnotenie:

<i>Za rok 2024</i>	Plánované	Skutočnosť
Financie	-	8 878,06 €
Ukazovatele (počet zrealizovaných projektov)	0	0

Zásobník ďalších aktivít (vyhodnotenie za rok 2024)			
	Názov	Realizované:	Opis
1.	Budovanie dažďových záhrad a vodozádržných opatrení v rámci existujúcej verejnej zelene, vrátane dobudovania záchytnej priekopy nad ulicou Viedenská a zabezpečenie správy rigolov na území MČ	Áno	Boli realizované dažďové záhrady pod Florparkom a pri Americkej triede (bývalé pohostinstvo Panoráma). V štádiu plánovania je záhrada na Varšavskej ulici č. 4-6 a prírodné jazierka a hrádzky v rámci tzv. lokality Sahara.
2.	Revitalizácia existujúcich športovísk a detských ihrísk (výmena prvkov, povrchov, riešenie problematiky oplotenia) v zmysle princípov v Koncepcii rozvoja športu	Áno	Realizované menšie opravy na ihriskách.
3.	Modernizácia systému vykurovania priestorov miestneho úradu	Nie	V roku 2024 nerealizovaná modernizácia. Do budúca sa predpokladá využiť modely využívajúce solárnu energiu. Problém je multifunkcia budovy a nevysporiadané pozemky – nemožnosť čerpania externých zdrojov.
4.	Zriadenie rezidentského systému parkovania v MČ	Čiastočne	V roku 2024 bolo realizované sčítanie vozidiel na území MČ ako prvý krok k zavedeniu systému parkovacej politiky. V roku 2025 je v pláne zjednosmernenie vytipovaných ulíc a vyznačenie miest na povolenie státia na chodníku ako ďalší z krokov.
5.	Cyklistické prepojenie MČ – mesto Košice, napojenie na Eurovelo 11	Nie	V problematike nebol zaznamenaný žiaden posun, čaká sa na schválenie nového územného plánu
6.	Vybudovanie krytej športovej haly na území MČ	Nie	V roku 2024 nebola realizovaná, nie je predpoklad na realizáciu v rokoch 2025 – 2026.

7.	Výmena asfaltového povrchu na Ázijskej, Európskej a Americkej triede z hľadiska hlučnosti na základe výsledkov hlukovej štúdie	Čiastočne	V roku 2024 bola realizovaná výmena asfaltového povrchu na Americkej triede, v roku 2025 sa predpokladá realizácia výmeny asfaltového povrchu na tzv. malej Americkej triede.
8.	Obstaranie multifunkčného komunálneho vozidla/multikáry	Áno	V roku 2024 bola aktivita zrealizovaná.
9.	Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov v MČ v lokalite Čínska – Mončí potok	Čiastočne	V roku 2024 bol prepracovaný kompletný realizačný projekt, v roku 2025 sa predpokladá vybavovanie povolenacích procesov a nájdenie zdrojov externého financovania. V roku 2026 by mohlo dôjsť k realizácii.
10.	Prepojenie Americkej triedy a Želiarskej ulice bezpečným chodníkom vrátane priechodu pre chodcov cez Americkú triedu	Nie	V roku 2024 táto aktivita nebola realizovaná, aktuálna legislatíva daný zámer neumožňuje.
11.	Debarierizácia vnútrobloku Čínska	Áno	Táto aktivita bola v roku 2024 realizovaná.
12.	Revitalizácia okolia pamätihodnosti „zmierovací kríž“	Nie	Táto aktivita nebola v roku 2024 realizovaná.
Ďalšie aktivity v úrovni vízií pre budúce obdobia			
1.	Výstavba kultúrneho domu (klubová časť, verejná knižnica, galéria)	Nie	Táto aktivita v roku 2024 nebola realizovaná a nie je ani v pláne pre nadchádzajúce obdobie 2025/2026. Do budúcnosti by takýto priestor mohol vzniknúť v rámci plánovanej 4. a 5. stavby sídliska, či územia pod Americkou triedou.
2.	Napojenie MČ na mestskú električkovú sieť, terminál Sever	Nie	Táto aktivita v roku 2024 nebola realizovaná a nie je v pláne pre nadchádzajúce obdobie 2025/2026. Uvažuje sa s ním však v rámci nového územného plánu.

8. Bezpečnosť sídliska zlepšováním a dopĺňáním kamerového systému

opis aktivity	Cieľom je zvyšovať bezpečnosť obyvateľov sídliska dopĺňaním kamerového systému. V rámci uvedenej aktivity sa uvažuje o: 1. zriadení miestneho kamerového pultu v priestoroch MP na území MČ 2. rozšírení existujúceho mestského kamerového systému Aktivitu bude realizovať mesto Košice ako správca existujúceho kamerového systému a subjekt, pod ktorého spadá mestská polícia v úzkej súčinnosti s mestskou časťou.					
súlads PHSR	vízia		téma		oblasť	
	INKLUZÍVNE MESTO		Spoločenský rozvoj		bezpečnosť	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	MČ / mestská polícia			Mesto Košice mestská polícia / MČ		
financovanie	vlastné zdroje alebo rozpočet mesta + štrukturálne fondy EÚ, Plán obnovy, dotácie					
ukazovatele	počet osadených nových kamier					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	15 000 € (obstaranie projektovej dokumentácie)	0	7 000 € (zriadenie miestneho kamerového pultu)	0	30 000 €	5

8. Bezpečnosť sídliska zlepšovaním a dopĺňaním kamerového systému

opis aktivity	Cieľom je zvyšovať bezpečnosť obyvateľov sídliska dopĺňaním kamerového systému. Pre riešenie aktivity bolo schválené Uznesenie číslo 91/2023 zo 6.zasdnutia MZ MČ Košice – Sídlisko- Ťahanovce zo dňa 21.6.2023 a) príprava PD a b) financovanie PD z rozpočtu MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce vo výške 15 000 EUR. Za tým účelom pre riešenie problematiky bola vymenovaná pracovná skupina zložená so zástupcov MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, poslancov MZ, členov Komisie RDaV a MP . Predsedom pracovnej skupiny je poslanec MZ MČ Košice - Sídliska Ťahanovce Mgr. Marek Fedoročko. Hlavnou úlohou bolo vypracovať podklady pre VO zadania spracovania PD. Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre kamerový systém MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce, vrátane technickej dokumentácie, návrhu umiestnenia a pripojenia kamerového systému do kamerového systému Mestskej polície Košice. V mesiaci september - október sa uskutočnil vyber na projektanta pre spracovanie projektovej dokumentácie, do ktorého sa neprihlásil žiadnen z oslovených uchádzačov. Na základe uvedeného je do budúca možné uvažovať s 2 alternatívami: 1. zopakovať výber projektanta na vypracovanie projektovej dokumentácie a upraviť požiadavky MČ pre výber 2. upustiť od zámeru nového kamerového systému pre MČ a prípravy projektovej dokumentácie, potrebnej pre žiadosť o externé finančné zdroje v budúcnosti ale v počiatočnej fáze zriadiť miestny kamerový pult na stanici MsP Sídlisko Ťahanovce tak, aby aj policajti na tejto stanici videli online obraz zo 7 resp. 13 kamier, ktoré sú umiestnené na sídlisku Ťahanovce. Následne by došlo k postupnému dopĺňaniu kamier (odhadom 3 ks kamier ročne).					
súlads PHSR	vília		téma		oblasť	
	INKLUZÍVNE MESTO		Spoločenský rozvoj		bezpečnosť	
gestor / partneri	gestor			partneri		
	MČ / mestská polícia			Mesto Košice mestská polícia / MČ		
financovanie	vlastné zdroje alebo rozpočet mesta + štrukturálne fondy EÚ, Plán obnovy, dotácie					
ukazovatele	počet osadených nových kamier					
harmonogram	2024		2025		2026	
	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov	plánované financie	plánovaná hodnota ukazovateľov
	7 000 € (zriadenie miestneho kamerového pultu)	0	30 000 €	5	30 000 €	5
